




Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

Informe a la población de Apurímac

100 DÍAS DE GESTIÓN

Gestión 2023-2026

Gobierno Regional de Apurímac

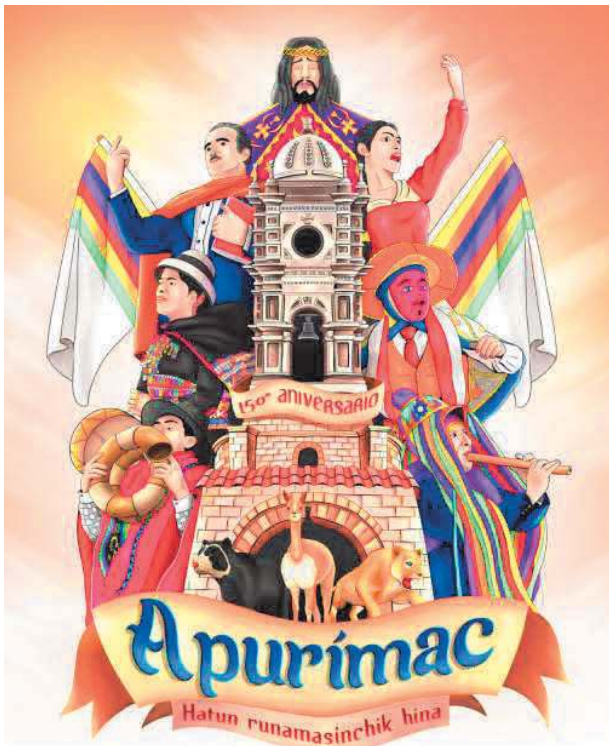

2023 - 2026

Gobierno Regional

APURÍMAC

Unidos por el pueblo

150

**Aniversario
de creación Política**






Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo



2023 - 2026

VISIÓN REGIONAL

Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

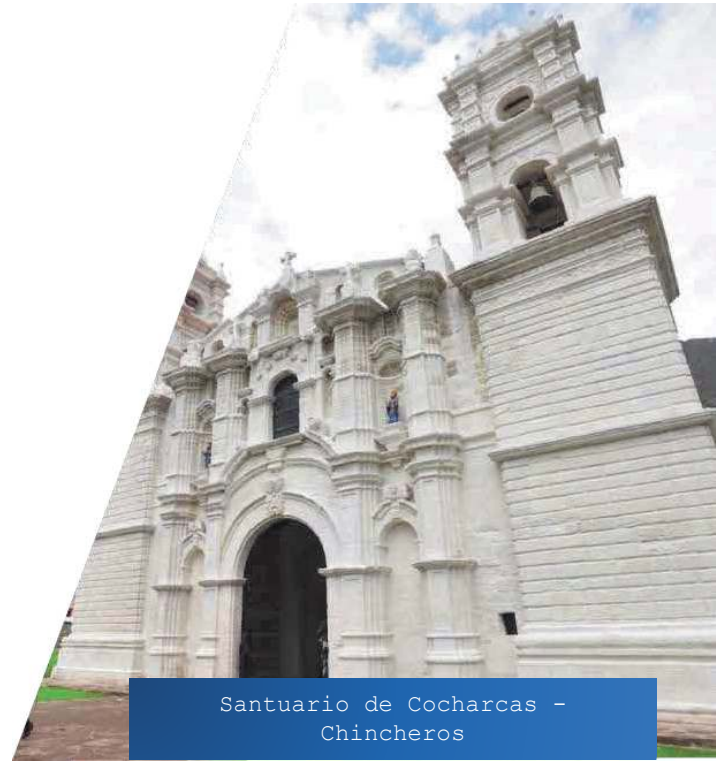

Santuario de Cocharcas -
Chincheros



Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

MARCA REGIONAL

Colores

En cuanto a los colores, estos fueron extraídos de las 7 banderas de cada una de nuestras provincias, encontrando similitudes entre una y otra, obteniendo una paleta variada de colores.



Marca de Gestión 2023 - 2026



Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

Ordenanza Regional N° 002-2023-GR-APURÍMAC/CR

Elementos gráficos



PARTICIPACIÓN / UNIDAD

Figura de una persona con las manos levantadas, estilo basado en la textilera apurímarca, de patrones geométricos comunes encontrados en los vestimentos de cada una de las 7 provincias y, que a su vez este símbolo representa la unidad y participación de toda la región.



UNIDAD / TRABAJO

En el centro del isotipo se ubica el mapa de Apurímac, símbolo distintivo y fácil de reconocer y, que a su vez genera sentimiento de pertenencia e identidad.



ESLOGAN

Consideramos necesario fortalecer la política de comunicación del Gobierno Regional con el logo y frase "UNIDOS POR EL PUEBLO", que resume nuestra identidad y compromiso: somos el gobierno del pueblo y para el pueblo.



Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo



2023 - 2026

ACCIONES INSTITUCIONALES

Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo



Laguna de Pacucha - Andahuaylas



Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

DEMANDA ADICIONAL PARA INVERSIÓN



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA GENERAL REGIONAL

"Jai de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

OFICIO N° 096 -2023-GRAP/06/GG

Abancay, 01 de marzo de 2023

Salto:
Alc. Alonso Contreras Miranda
Ministerio De Economía Y Finanzas

Con atención:
Jessica Roxana Camacho Medina
Director General de Presupuesto Público
Ministerio De Economía Y Finanzas
Lima-

Asunto : Solicitud de Demanda Adicional de Recursos para el ejercicio presupuestal 2023

Referencia : INFORME N°076-2023-GRAP/06/GRPPAT

Previo a cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de informar que acuerdo al proceso de Consistencia del Programa Multianual de Inversiones 2023-2026 realizado en coordinación con las Unidades Ejecutoras de Inversiones de nuestra algea y ajustado por Ley de Presupuesto para el año 2023, se ha priorizado 122 inversiones por un monto de S/. 297,698,420.00 soles, sin embargo, estos recursos son insuficientes para asegurar la continuidad de la ejecución.

Por ello se han identificado 89 inversiones que de acuerdo al orden de prelación y plane de ejecución deberían concluirse en el año 2023, por lo que se requiere un monto adicional de S/. 208,578,700.30 soles para cubrir el déficit presupuestal para el año 2023.

Por lo indicado y a fin de coadyuvar el desarrollo económico de nuestra Región, solicito a nombre del Gobierno Regional de Apurímac, una Demanda Adicional de Presupuesto para el año 2023 por un monto de S/. 208,578,700.30 soles, por las consideraciones referidas en el documento en referencia, emitida por la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuestal y Accondicionamiento Territorial.

Agradeciendo desde ya la atención oportuna que brindará al presente, es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración.


Atentamente,

Mg. César Augusto Alvarado Vera
DIRECTOR GENERAL REGIONAL

EN FEBRERO DEL 2023, SE SOLICITO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, **UNA DEMANDA ADICIONAL DE RECURSOS POR S/208,578,700.30 SOLES**, PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTAL DE **89 INVERSIONES PRIORIZADAS QUE DEBEN CONCLUIRSE EL AÑO 2023**



INVERSIONES Y OBRAS PARALIZADAS

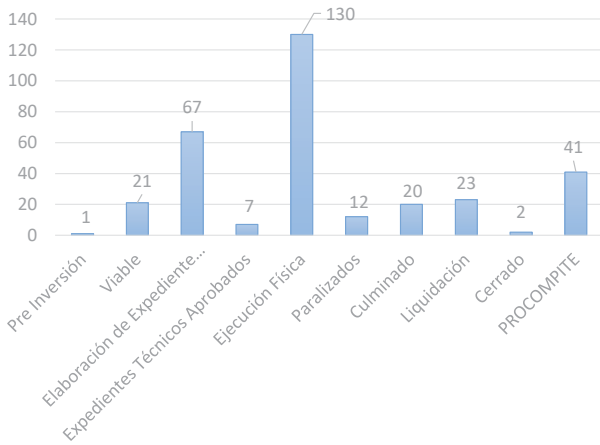

N°	FASE	CANTIDAD	PIM 2023
0.-	Pre Inversión	1	9,116,531.00
1.-	Viable	21	2,064,485.00
2.-	Elaboración de Expediente Técnico	67	48,526,624.00
3.-	Expedientes Técnicos Aprobados	7	5,854,376.00
4.-	Ejecución Física	130	193,828,761.00
5.-	Paralizados	12	34,764,418.00
6.-	Culminado	20	306,345.00
7.-	Liquidación	23	57,816.00
8.-	Cerrado	2	223,563.00
9.-	PROCOMPITE	41	2,000,000.00
TOTAL		324	S/ 296,742,919.00



ANDAHUAYLAS

En el marco de la Ley N° 31589 que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, el gobernador regional Percy Godoy Medina y la ministra de Salud Rosa Gutiérrez Palomino acordaron iniciar el proceso de **destrabe para la culminación de la anhelada obra de ejecución del Hospital II-2** de Andahuaylas, inmovilizada desde hace 12 años y que ahora se hará realidad su culminación.

ENTREGA EN ETAPAS DEL HOSPITAL II DE ANDAHUAYLAS






Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo



2023 - 2026

SECTOR SALUD

Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

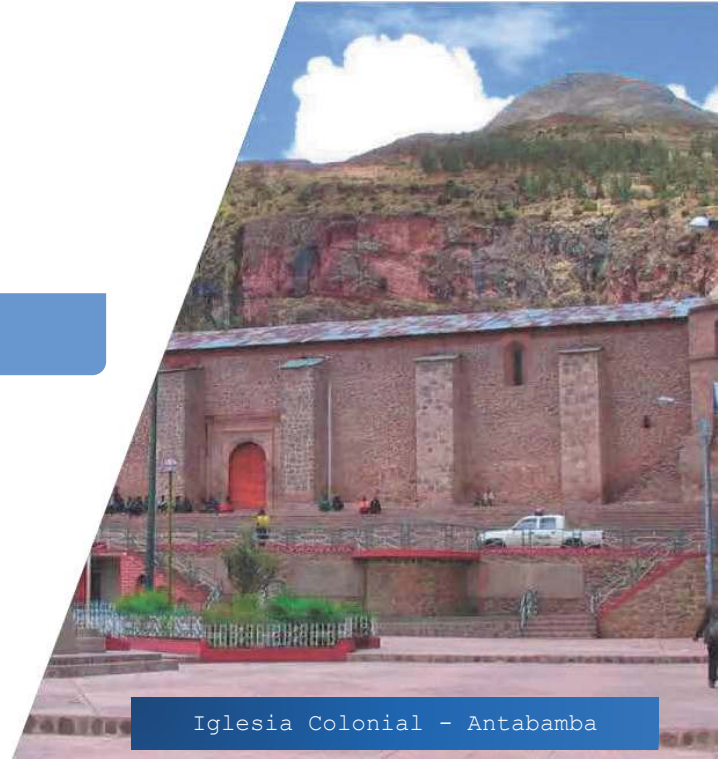

Iglesia Colonial - Antabamba



Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

ABANCAY

HOSPITAL DE ABANCAY, INICIO DE EXPEDIENTE TÉCNICO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD NIVEL III - 1

CON UNA INVERSIÓN DE S/ 847 MILLONES
GOBERNADOR PERCY GODOY Y MINISTRA DE
SALUD SUSCRIBEN CONVENIO PARA HACER
REALIDAD NUEVO HOSPITAL III-1 GUILLERMO
DÍAZ DE LA VEGA DE ABANCAY



El acuerdo suscrito tiene una vigencia de dos años y establece que el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) del Minsa elabore y supervise el expediente técnico de dicho establecimiento de salud con el objetivo de asegurar la pronta construcción de este anhelado proyecto, que se ejecutará después de más de 20 años y que gracias a las gestiones constantes del gobernador Percy Godoy se hará realidad para mejorar la atención médica de manera oportuna y concretar el cierre de brechas de infraestructuras hospitalarias en la región.



Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

CHINCHEROS

Convenio
PRONIS



Hospital de Chincheros II-1



Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

COTABAMBAS



Hospital Challhuahuacho II-1



Centro de Salud Tambobamba (I-4)

Convenio PRONIS




Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo



2023 - 2026

ANILLOS VIALES

Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

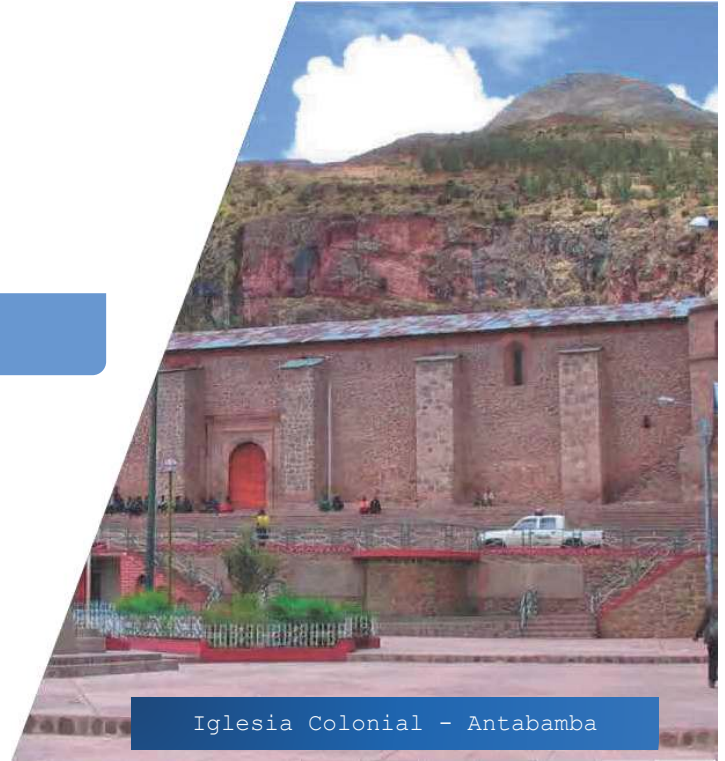

Iglesia Colonial - Antabamba



Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

CUI	DESCRIPCIÓN	MONTO	ENTIDAD/SECTOR
2474480	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EMP. PE-3 S (TALAVERA) - OMACA - OCOBAMBA - ROCCHAC - ONGOY - HUACCANA - MARAMORA - PULCAY L.D. AYACUCHO (CCANCHY, AY-102 A CHUNGUI) EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	228,247,392.78	PROVIAS DESCENTRALIZADO – MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
2544505	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA YACA-OCOBAMBA-TACCACCA-RUNAHUAÑUSCCA, DE LOS DISTRITOS DE CIRCA Y CHUQUIBAMBILLA DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	90,316,681.72	PROVIAS DESCENTRALIZADO – MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES




Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo



2023 - 2026

SECTOR AGROPECUARIO

Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

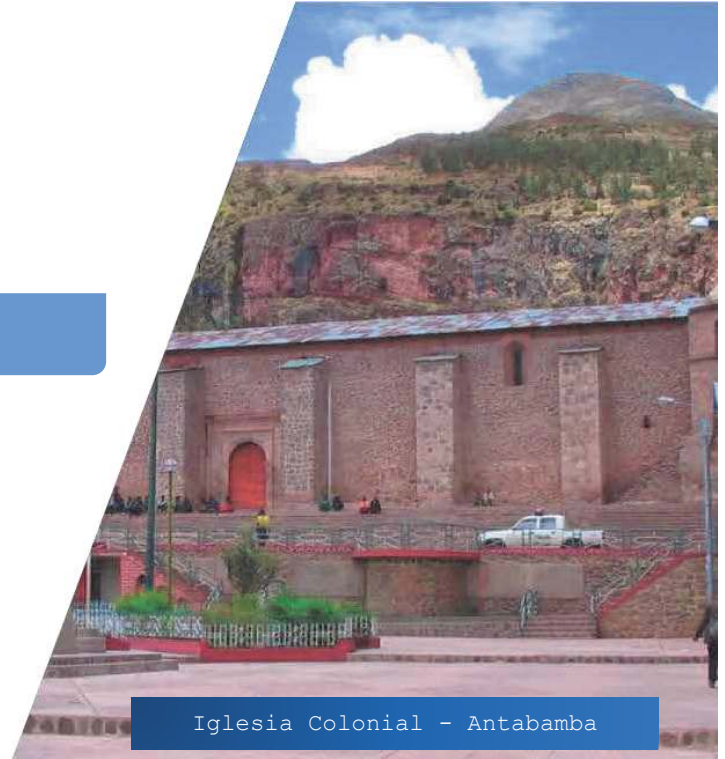

Iglesia Colonial - Antabamba



Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

ANDAHUAYLAS

PROYECTO AMPLIACIÓN DE RIEGO PARA SAN JERÓNIMO Y JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ANDAHUAYLAS


Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN ANCCARAYLLA, CCACCE, CHAVELAYOC, PALMA REAL, SANTA ROSA ALTA UNIÓN CLAVELES, CUNCAIYOC, CCACHCCARUMIHUAYCCO, RAYANNIYOC, CCOCHO MOCCO, SANTA ANITA ANASORCCO, SACHAYOC MOCCO, CABALLO OCCO, PURMACC, WASICUCHO, POTRERO OCCO, CCALLPA MOCCO, CUMANAYLLA, CHECCHES, SACLAYA, ÑAHUINPUQUIO, HUARACOPATA, CCANCHUPATA Y CHAQUICCOCHAPATA, EN LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, SAN JERÓNIMO Y JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, CUI N° 2541486.

Monto según actualizado

S/. 74,005,855.3

Expediente técnico culminado

Se realizan coordinaciones con el Ministerio de Agricultura para su pronta ejecución

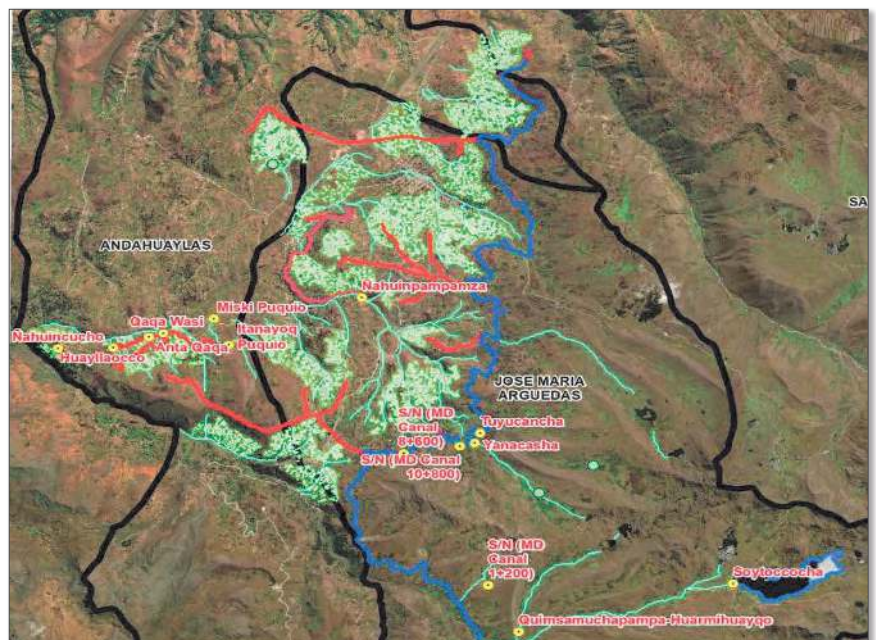



Inversión Estratégica REGIONAL

Contará un presupuesto de más de 60 millones de soles y permitirá la siembra y cosecha de los recursos hídricos para el fortalecimiento sostenido de la actividad agro pecuaria en las siete provincias apurimeñas.



GERENTE GENERAL REGIONAL




Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo



2023 - 2026

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

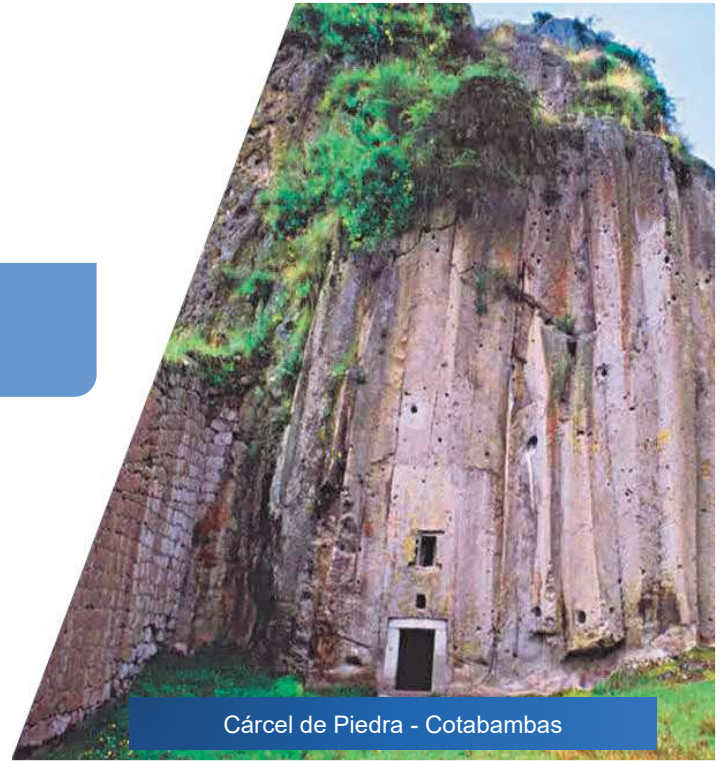

Cárcel de Piedra - Cotabambas



Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

TRANSPARENCIA

ACCIONES PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES



- **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**
 - Para la realización de acciones de Control Concurrente.
TRANSFERENCIA PROGRAMADA S/ 1,323,381 (36 inversiones).
- **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**
 - Para la realización de acciones de Control Concurrente, Posterior y Servicio Relacionado. Contratación de profesionales.
- **SOCIEDAD AUDITORA**
 - Realización de Auditoría a los Estados Financieros y Presupuestarios en las UE del Gobierno Regional

- ✓ Control social efectuado por los beneficiarios de las inversiones
- ✓ El acompañamiento de la AT MEF en todo el ciclo de inversiones y contrataciones
- ✓ Acompañamiento del equipo técnico de la Cooperación Suiza
- ✓ Informe al Consejo Regional de 27 de marzo de 2023



PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

Expedientes Administrativos encontrados

Pertencientes a los años	Cantidad Expedientes	Pendientes de atender	Servidores sancionados
2018	185	70	2
2019	168	101	11
2020	45	2	15
2021	93	25	5
2022	185	165	0
2023	16	16	3

Año 2023

- **Suspensiones:** **01**
- **Amonestaciones:** **02**
- **Archivados:** **04**
- **Prescritos:** **10**

Inicio de Proceso:

- **Funcionarios:** **08**
- **Servidor:** **05**



PROCURADURIA

CARGA PROCESAL GENERAL ENCONTRADA AL INICIO DE GESTIÓN

MATERIA	EN TRÁMITE (a)	CON SENTENCIA CONSENTIDA (b)	EN TRÁMITE Y EN EJECUCIÓN	ARCHIVOS** (c)	
				ARCHIVOS CON SENTENCIA	ARCHIVOS SIN SENTENCIA
Penal	201	63	264	44	73
Civil	879	458	1337	175	0
Constitucional	1841	541	2382	469	0
Contencioso Administrativo	7200	5711	12911	985	0
Laboral	950	420	1370	13	0
Arbitraje	21	10 (Laudos)	31	62	0
Conciliación	10	11	21	0	90
Proceso internacional	0	0	0	0	0
Administrativo	8	0	8	0	0
Supranacional	0	0	0	0	0
TOTAL	11,110	7,214	18,324	1,748	163


**ARCHIVOS: se refiere a los casos archivados de todos los periodos. Los ARCHIVOS SIN SENTENCIA son aquellos casos donde no hubo ejecución ni tuvieron sentencia consentida y los ARCHIVOS CON SENTENCIA son aquellos casos que luego de haber culminado la ejecución con sentencia fueron archivados.



2023 - 2026

DIFICULTADES A NIVEL DE FINANCIAMIENTO

Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

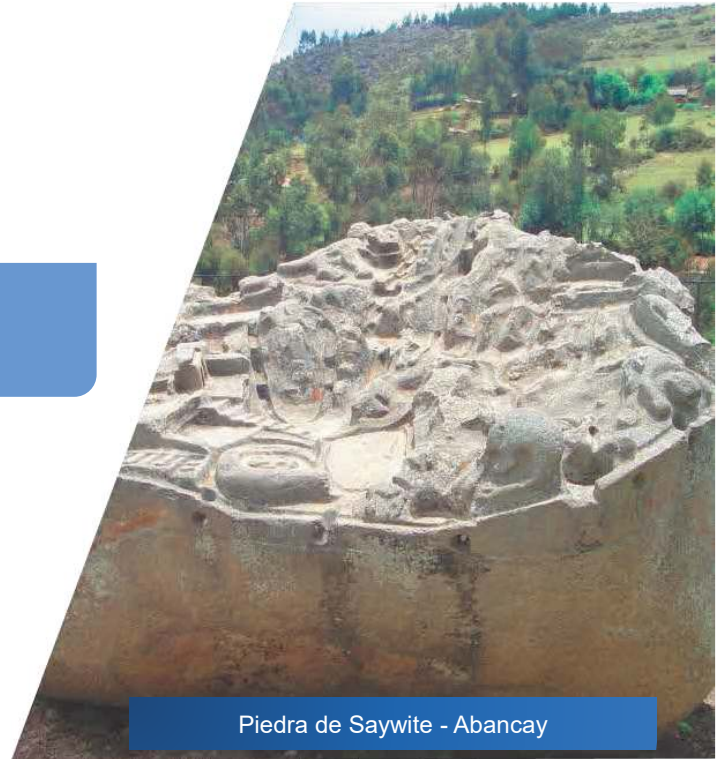

Piedra de Saywite - Abancay



DIFICULTAD EN EL FINANCIAMIENTO

PROYECTOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA SU CULMINACIÓN

CUL	NOMBRE	FASE	COSTO ACTUALIZA	% DE EJECUCION FINANCIERA A MARZO 2023	PENDIENTE POR ASIGNAR	PIM 2023	SALDO PROGRAMABLE
2233835	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGO CONTRA INUNDACIONES EN 3.240 KM DEL CAUCE DEL RIO CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAE DE LA REGION APURIMAC	4. Ejecución Física	67,038,047.33	2.27%	65,515,520.78	2,867,072.00	62,648,448.78
2337801	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICA DE PROGRESO Y VILCABAMBA DE LOS DISTRITOS PROGRESO Y VILCABAMBA, DE LA PROVINCIA GRAU - APURIMAC	4. Ejecución Física	42,652,808.16	15.01%	36,251,114.16	6,701,906.00	29,549,208.16
2292623	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC	9. Cerrado	21,733,843.42	1.30%	21,451,142.08	0.00	21,451,142.08
2312428	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO N 54385 SEÑOR DE LA EXALTACION, N 54621 FIDELIA VALENZUELA Y N 54389 PATAPATA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA DE GRAU - REGION APURIMAC	4. Ejecución Física	30,181,189.04	18.90%	24,476,854.24	3,817,533.00	20,659,321.24
2293663	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS TRES NIVELES INICIAL 101 EL CARMELO, PRIMARIA 54045 EL CARMELO Y SECUNDARIA EL CARMELO DE LA LOCALIDAD MOLINOPATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC	4. Ejecución Física	24,779,978.19	9.90%	22,327,859.95	4,274,263.00	18,053,596.95
2305409	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DE CCARAYHUACHO, LAHUANI, PATARIO, HUANCURI Y SAUSAMA, DISTRITO DE CHALLHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	4. Ejecución Física	17,223,695.00	2.67%	16,764,046.00	0.00	16,764,046.00
2301566	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE ANTABAMBA Y RIO PAMPAS DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC	4. Ejecución Física	17,318,164.23	32.99%	11,605,451.87	0.00	11,605,451.87



Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo



2023 - 2026

SITUACIÓN ENCONTRADA POR SISTEMA ADMINISTRATIVO

Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo



Santuario Nacional del Ampay - Abancay



Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SITUACIÓN ENCONTRADA	ACCIONES IMPLEMENTADAS PRIMEROS 100 DÍAS
<p>SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Instrumentos de Gestión y Directiva Desactualizadas (CAP, PAD, RIT y viáticos). Se encontró 191 trabajadores con D.L. 276, 40 trabajadores con D.L. 1057 (CAS) y 465 personas con contrato temporal diciembre del 2022 Se encontró 48 procesos judiciales, 14 sentencias y 34 medidas cautelares. 	<ul style="list-style-type: none"> Se viene actualizando los documentos de Gestión. Continúan los mismos trabajadores de D.L. 276 y CAS y 450 temporales. Se generó 3414 puestos de trabajo para personal obrero en Régimen de construcción civil. Se solicitó al MEF incremento de plazas para atender las demandas.
<p>SISTEMA DE TESORERÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> Comprobantes de pagos del año 2022, sin la firma del Tesorero, Contador y Administrador. Se tiene 57 cartas fianzas en custodia que datan del año 2012 al 2022. 	<ul style="list-style-type: none"> Se notifico a los ex funcionarios para cumplan con su responsabilidad y a la administración para e inicio de deslinde de responsabilidades. Se viene evaluando con la Procuraduría Regional la ejecución de las Cartas Fianzas de ejercicios anteriores.



SITUACIÓN ENCONTRADA

ACCIONES IMPLEMENTADAS PRIMEROS DÍAS

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

- **No se contó con el inventario de bienes en almacén central y sub almacenes**

- Se viene efectuando el inventario de los bienes en todos los almacenes.
- Se realizó el informe para el deslinde de responsabilidades.

SISTEMA DE CONTABILIDAD


- **Se encuentra pendiente la depuración y sinceramiento contable, con un avance del Plan al 2% .**

- Se realiza la depuración y sinceramiento contable en coordinación con las diversas oficinas administrativas y Unidades Ejecutoras.



2023 - 2026

GERENCIAS SUBREGIONALES

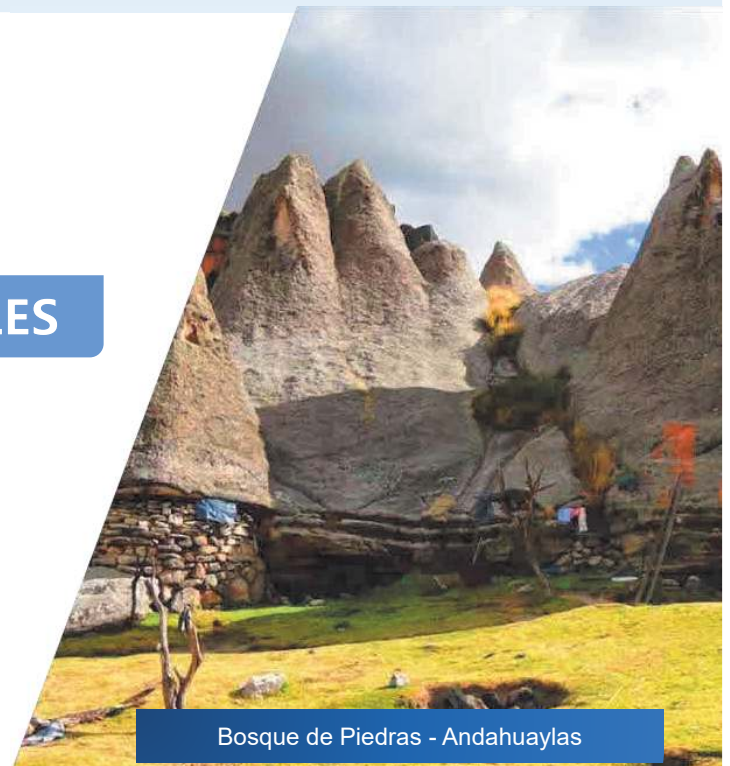



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES EN LA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS DISTRITO DE ANDAHUAYLAS



MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA DE LA COMUNIDAD DE LAMAY, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO


PROYECTOS DE INVERSIÓN	CUI	Monto según ET	Monto Actualizado	% Ejecución Física		% Ejecución Financiera
				Programado	Ejecutado	
PROYECTO DE IRRIGACION CHUMBAO	2046407	33,322,706.00	79,461,675.93	100.00%	87.46%	87.72%
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES SILCANI, HUAYLLABAMBA, POCULLO COCHA DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	2243521	7,649,876.00	11,012,502.02	70.96%	24.32%	33.19%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC	2300107	9,851,469.00	17,172,811.98	100.00%	71.31%	78.16%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LAS IES NRO. 986 DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, NRO. 1125 DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, NRO. 1136, NRO. 1137, NRO. 1138 DEL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC	2307628	9,213,939.00	8,977,468.66	100.00%	100.00%	98.46%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N 288 DE CHECCHÉ, N 930 DE HUARACCO PATA, N 291 DE SACCLAYA Y N 299 DE CUMANAYLLA DEL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	2336772	4,890,437.00	9,657,431.12	94.34%	71.82%	87.93%
CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SECUNDARIA CONCERTADA SOLARIS N°55006-20, EN LA LOCALIDAD DE SUYLLUACCA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	2459164	7,770,713.09	10,066,400.06	91.32%	47.64%	83.45%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ADOPCION TECNOLOGICA PRODUCTIVA DEL PEJERREY (ODONTHESITES BONAERIENCES) EN 15 LAGUNAS CON POTENCIAL PRODUCTIVO EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	2473552	3,962,079.30	8,061,486.75	83.50	29.08%	43.25%

PROYECTO: "IRRIGACIÓN CHUMBAO"



Monto de la inversión:	
Monto según ET:	33,322,706.00
Monto actualizado:	79,461,675.93
Monto de adicionales	46,138,969.93 138% de Incremento
% Ejecución física al 31/12/2022	PROGRAMADO
	100.00% 87.46 %
% Ejecución financiera	PROGRAMADO
	100.00% 87.72 %
Fecha de inicio de obra (3años)	02/08/2010
Fecha de término programado	30/11/2023
PIM 2023	1,999,972.00
Situación encontrada: PARALIZADO Y ATRASADO por deficiente asignación presupuestal y demora en proceso de adquisición de los materiales y actualización del expediente de saldo de obra. Plazo de ejecución vencido el 19 de Octubre del 2022.	
Acciones Implementadas: Se ha tramitado la AMPLIACIÓN DE PLAZO para la culminación de la obra en el presente año. Se da reinicio de obra el 15 de marzo del 2023. Se ha tramitado modificación en fase de ejecución para la culminación de la obra sin incremento presupuestal. Avance físico actual 90% abril 2023	

PROYECTO: "CREACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALIENTE DESDE PUENTE COLONIAL - AV. LOS LIBERTADORES - HASTA PUENTE SUYLLUACCA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC".
CÓDIGO ÚNICO: 2280911

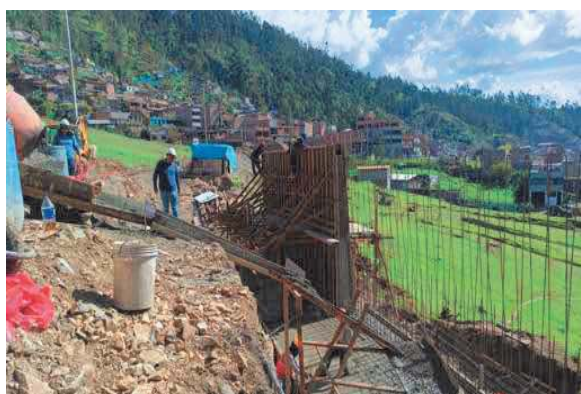

Monto de la inversión:		
Monto según ET:	7,102,803.00	
Monto actualizado:	19,409,100.91	
Monto de adicionales	12,306,297.91	173% de Incremento
% Ejecución física al 31/12/2022	PROGRAMADO	EJECUTADO
	52.73 %	45.96 %
% Ejecución financiera	PROGRAMADO	EJECUTADO
	57.31 %	50.90 %
Fecha de inicio de obra (5 años)	16/08/2018	Atraso > 4 años
Fecha de término programado	07/09/2019	
PIM 2023	S/. 2,524,039.00	
Situación encontrada:		
1.- PARALIZADO Y ATRASADO por falta de asignación presupuestal		
2.-Plazo de ejecución vencido el 07 de SETIEMBRE del 2019.		
3.- Demora en los procesos de selección para la adquisición de los materiales en obra.		
4.-Problemas en alineamientos de eje de vía con los vecinos.		
Acciones Implementadas:		
1.-Se ha tramitado la AMPLIACIÓN DE PLAZO para la culminación de la obra en el presente año.		
2.-Se dio reinicio de obra el 18 de enero del 2023.		
Avance físico actual 50% abril 2023		

GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS

PROYECTOS DE INVERSIÓN	CUI	Monto según ET	Monto actualizado	% Ejecución física		% Ejecución financiera
				Programado	Ejecutado	
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURÍMAC	2164452	7,733,825.00	12,046,474.06	100.00%	56.22%	65.80%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL N 13 Y URIPA DE LOS DISTRITOS DE CHINCHEROS Y ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC	2329289	7,002,392.00	22,477,366.22	64.54%	63.04%	60.00%
INSTALACION DEL COLISEO CERRADO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	2220591	4,771,233.62	11,251,583.26	100.00%	99.10%	96.60%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. INTEGRAL N° 54481 DE NIVEL PRIMARIA Y COLEGIO MARIO VARGAS LLOSA DE OSCOLLO DEL DISTRITO DE COCHARCAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	2467972	6,723,786.07	11,262,661.34	100.00%	61.91%	58.70%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. NRO 475-19, I.E.P NRO 54240 Y I.E.S. FERNANDO BELAUNDE TERRY DEL CENTRO POBLADO - OCCOPATA DEL DISTRITO DE RANRACANCHA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	2412124	9,343,945.75	14,159,664.38	100.00%	19.80%	23.96%
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. EL SOL, AV. LOS SAUCES Y AV. BLANQUILLO DURAZNO, EN EL CENTRO POBLADO DE LLIMPE DEL DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	2459392	3,081,299.45	3,635,278.08	100.00%	50.91%	68.16%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PUTCAMAYO, RETAMAPAMPA - ANCASMAYO HACIA LOS SECTORES QUICCAPATA, HACIENDA, CRUZ PATA, PORSURO COLLPA DE LA COMUNIDAD DE CHACABAMBA, DEL DISTRITO DE ONGOY - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	2472125	2,102,301.10	3,659,202.91	100.00%	83.19%	83.09%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE URURILLO, CHINCHIBAMBA Y UVAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE PORVENIR LA CABAÑA, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	2473373	2,447,877.96	2,516,209.14	96.47%	94.06%	88.69%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO - WILFREDO BARZOLA PALOMINO DEL DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	2127734	1,304,437.00	2,485,888.76	100.00%	80.70%	68.83%



GERENCIA SUB REGIONAL CHINCHEROS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS".
CÓDIGO: 2164452



Monto de la inversión:		
Monto según ET:	7,733,825.00	
Monto actualizado:	12,046,474.06	
Monto de adicionales	4,312,649.06	55.76% de incremento
% Ejecución física (31/12/2022)	PROGRAMADO	EJECUTADO
	100.00%	56.22%
% Ejecución financiera (31/12/2022)	PROGRAMADO	EJECUTADO
	100.00%	65.80%
Fecha de inicio de obra (365 días)	05/11/2019	Atraso > 3 años
Fecha de término programado	08/03/2023	
PIM 2023	28,050.00	

Situación encontrada:

Atrasada y paralizada principalmente por problemas de inestabilidad de suelos de cimentación, que ponen en riesgo al infraestructura.
Asignación presupuestal insuficiente.

Acciones Implementadas:

Se ha solicitado asignación presupuestal para la formulación del expediente técnico de saldo de obra para garantizar el funcionamiento y la culminación de la ejecución física.
Luego de la aprobación del E.T. de saldo de obra se gestionará el financiamiento la ampliación de plazo respectiva.

Avance Físico 56.2% a marzo 2023



GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS



IEP PATAHUASI DEL DISTRITO DE HAQUIRA



I.E. N°50675 RICARDO PALMA SORIANO (204545) - YURICANCHA, DEL DISTRITO DE MARA

PROYECTOS DE INVERSIÓN	CUI	Monto según ET	Monto Actualizado	% Ejecución Física		% Ejecución Financiera
				Programado	Ejecutado	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES N 775, N 772, N 713, N 717, N 771, N 862, N 179, N 714, N 752, N 774, N 776, N 753 Y N 715, DEL DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC	2234671	14,483,111.00	27,510,458.68	100.00%	69.23%	78.81%
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N°50700 SEÑOR DE EXALTACION (205377), N°50643 RUFINO MONTESINOS UGARTECHE (411140), N° 50695 CHUYLLULLO (204743), N°50692 SAN JOSE (204719) 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	2507799	19,098,366.78	28,693,010.96	12.99 %	3.05 %	4.24 %



GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS

2234671: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES N 775, N 772, N 713, N 717, N 771, N 862, N 179, N 714, N 752, N 774, N 776, N 753 Y N 715, DEL DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC



Monto de la inversión:		
Monto según ET:	14,483,111.00	
Monto actualizado:	27,720,053.24	
Monto de adicionales	13,236,942.24	91.39% de Incremento
% Ejecución física al 31/12/2022	PROGRAMADO	EJECUTADO
	100.00%	69.23%
% Ejecución financiera	PROGRAMADO	EJECUTADO
	100.00%	78.81%
Fecha de inicio de obra (180 días)	26/09/2019	Atraso > 2 años
Fecha de término programado	23/03/2020	
PIM 2023	3,923,810.00	

Situación encontrada:

DEFICIENTES ASIGNACIONES PRESUPUESTALES (2019-2022), NO SE ASIGNARON LOS RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Acciones Implementadas:

EN MARZO SE REINICIO LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS COMPONENTES FALTANTES, SE VIENE SOLICITANDO UNA MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PRESENTE AÑO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA.

Avance físico actual (Abril 2023) 72.3%

GERENTE REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL

Gerencia Reg. Desarrollo Social

SITUACIÓN ENCONTRADA	ACCIONES IMPLEMENTADAS PRIMEROS DÍAS	ACCIONES PROGRAMADAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DURANTE EL 2023
<ul style="list-style-type: none"> Inconcluso proceso de adquisición de Computadoras Portátiles para Estudiantes y docentes de los Proyecto TICS, en el cual desde el año 2019 y 2020 no se adquieren. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de adquisición de Laptops docentes y alumnos se ha cumplido al 100%. Se logró la ampliación de presupuesto para Tic Cotabambas con la finalidad de dar continuidad a la ejecución y concluir el proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> Se tiene programado la capacitación de 753 docentes, Diplomado INTEGRACION Y APLICACIÓN DE LAS TIC COMO RECURSO DE ENSEÑANZA Y APRENDISAJE EN LA EDUCACION. De 4 meses de duración. Concluiremos el proyecto TIC EN COTABAMBAS.
<ul style="list-style-type: none"> Consejos Consultivos desactivadas y desatendidas que dificultan el trabajo para la mejorar de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables en la Región de Apurímac 	<ul style="list-style-type: none"> Se ha reactivado la Instancia Regional de Concertación (IRC) a través de ella se toma acuerdos para fortalecer acciones de prevención y sanción de violencia hacia las mujeres y grupo familiar. 	<ul style="list-style-type: none"> Implementar la ley N° 30364 y sus modificaciones que amparan y protegen a las mujeres e intrigantes del grupo familiar. Implementación de las políticas públicas de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades articulando esfuerzos de las Instancias Intergubernamentales e Intersectoriales.
<ul style="list-style-type: none"> Convenios con PRONATEL con plazo vencidos 	<ul style="list-style-type: none"> Se renovó el convenio, a fin de garantizar, servicios de internet en EESS y instituciones educativas de nuestra Región 	<ul style="list-style-type: none"> Entrega de 9,670 tabletas a instituciones educativas de la región.



PROYECTOS TICS EN ÁMBITO DE LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO EN LAS 7 PROVINCIAS DE LA REGIÓN APURÍMAC

PRESUPUESTO

PIM ASIGNADO 2023	S/. 9,439,333.00
CERTIFICADO PRESUPUESTAL	S/. 7,533,712.85
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	S/. 7,356,016.60

BENEFICIARIOS

PROVINCIAS	7 Provincias
ESTUDIANTES	11,855 Estudiantes
DOCENTES	1,044 Docentes
INSTITUCIONES BENEFICIARIAS	45 I.I.EE



SITUACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN LA REGIÓN APURÍMAC 2009-2022



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ANEMIA EN NIÑOS (AS) MENORES DE TRES AÑOS Y GESTANTES, EN LA REGIÓN APURÍMAC

BENEFICIARIOS

PROVINCIAS	7 Provincias
NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 03 AÑOS	7,297 Niños y Niñas
GESTANTES	8,299 Gestantes

COMENTARIOS

Este proyecto no ha sido priorizado, no obstante se realizó el gasto durante los 02 años .

Se está realizando las gestiones y coordinaciones para activar el proyecto.





SE GARANTIZA FINANCIAMIENTO PARA ATENCIONES POR EL SIS


Se firma Convenio entre el Seguro Integral de Salud – SIS, Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL y el Gobierno Regional de Apurímac para garantizar las atenciones a los asegurados del SIS por un monto de S/. 33 millones 353 mil 986 soles, incremento la negociación por más de 4 millones.



CAMPAÑA DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA

Se realizaron más de 9,1800 atenciones en las diferentes especialidades en todas las provincias, como parte del acercamiento de los EESS a la población.

En la Provincia de Aymaraes como inicio de sus actividades como Hospital II E de Emergencias de Challhuanca se realizaron diversos procedimientos quirúrgicos.

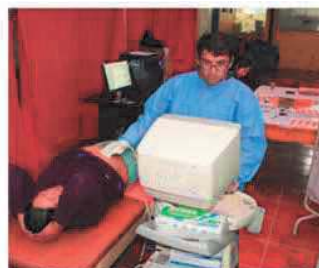



Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Más infraestructura para la educación

CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE Y PROGRESO - VILCABAMBA Y CHINCHEROS.

PROGRESO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS IESTP DE PROGRESO Y VILCABAMBA DE LOS DISTRITOS PROGRESO Y VILCABAMBA – GRAU.



CHINCHEROS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS IESTP DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS



Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Más infraestructura para la educación

RETORNO A CLASES

100% DE ESTUDIANTES RETORNARON AL INICIO DE CLASES EL 13 DE MARZO 2023



PLAN KALLPACHASUN MULTISECTORIAL

100% DE AUTORIDADES COMPROMETIDAS CON LA EDUCACIÓN DE APURÍMAC





ENTREGA DE 9,670 TABLETAS A ESTUDIANTES DE LOS ESTRATOS MÁS POBRES DE LA REGIÓN




Acción estratégica	Estado situacional	Actividades
Local institucional	Ejecución al 92.65 % esta pendiente la implementación del Data Center y un Vehículo.	Conclusión de actividades y adquisiciones para la entrega.
Convenio LURAWI PERU	DRTPE pueda intervenir al universo de beneficiarios de dicho programa con los servicios que prestamos.	
Convenio con el Ministerio de Trabajo	Servicio de la Oficina del Centro Integrado "Formaliza Perú"	Servicio de asesoramiento y orientación legal a las MYPES
Convenio con el Ministerio de Trabajo	Programa Nacional para la Empleabilidad	Empleabilidad de personas mayores de 15 años en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad sociolaboral a través de la capacitación laboral, la promoción del autoempleo y la certificación de las competencias.
Convenio con las 07 provincias	Fortalecer el desarrollo de capacidades	Ampliar la cobertura de los servicios gratuitos ofrecidos por la DRTPE, en materia de promoción del empleo y normativa laboral
Instalación y Operatividad de los Consejos Regionales	Proceso de instalación y articulación de consejos regionales	Consejos Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, (CRTPE). Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CORSSAT). Comité Directivo Regional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CDRPETI).

CAPACITACIONES



Convenios Logrados



COMITES REGIONALES



IMPULSANDO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS



HOSPITAL CHALHUAHUACHO



HOSPITAL TAMBOMBAMBA

Hospital Andahuaylas	160,142,000.00
Hospital Tambobamba	121,327,745.00
Hospital Chuquibambilla	67,557,133.14
Hospital Challhuahuacho	85,246,573.37
Hospital Chincheros	162,372,372.00
Centro de Salud de Haquira	46,161,389.00
TOTAL	S/ 685,167,345.00



**MEGA PROYECTO HOSPITAL
CATEGORIA III-1
847'520,050.26
Millones de Soles**



**HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA
PROPUESTA ARQUITECTONICA**

VISTA AEREA 1

Gerencia Reg. Desarrollo Social Aldea Infantil Virgen Del Rosario

SITUACIÓN ENCONTRADA	ACCIONES IMPLEMENTADAS PRIMEROS DÍAS	ACCIONES PROGRAMADAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DURANTE EL 2023
<ul style="list-style-type: none"> INFRAESTRUCTURA DETERIORADA, JARDINES DESCUIDADOS, 	<ul style="list-style-type: none"> PINTADO DE PAREDES MEJORAMIENTO DE JARDINES BIOHUERTOS Y LUGARES DE ESPARCIMIENTO. IMPLEMENTACIÓN DE CRIANZA DE ANIMALES MENORES 	<ul style="list-style-type: none"> CONVENIOS CON INPE, PARA TRABAJO COMUNITARIO CONVENIO CON UTEA
<ul style="list-style-type: none"> NIÑOS QUE AL SER EXTERNADOS NO SE INSERTAN AL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CETPRO, UNIVERSIDADES, INSTITUTOS. 	<ul style="list-style-type: none"> COORDINACION CON UNIVERSIDADES, INTITUTOS SUPERIORES. CORDINACION CON PRONABEC. 	<ul style="list-style-type: none"> CONVENIO ENTRE GORE UNAMBA, PARA GRATUIDAD DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO PARA LOS NIÑOS QUE CURSAN EL ULTIMO AÑO. Y EXONERACIÓN DE COSTO DE POSTULACIÓN. CONVENIO CON CEPRO ABANCAY.
<ul style="list-style-type: none"> NIÑOS DESMOTIVADOS, CON CAPACIDAD OCIOSA. 	<ul style="list-style-type: none"> TALLERES, DE CAPACITACION, SENSIBILIZACION PERIODICAS. TRABAJO EN VALORES PASEOS 	<ul style="list-style-type: none"> ARTICULACIÓN CON PNP, UNIVERSIDADES, ENTIDADES PRIVADAS

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CARTERA DE INVERSIONES AL 2022

Cantidad	Detalle	Monto invertido	Observación
62	PROYECTOS INVERSION	185'111,032.00	EN LAS 7 PROVINCIAS, EN EJECUCIÓN O ELABORACIÓN E.T.



PROYECTOS EN PROCESO DE CIERRE 2022

Nro.	Detalle	Monto Invertido 2022	PIA 2023
14	PROYECTOS INVERSION	95'066,959.15	1'483,289.00

PROYECTOS EN EJECUCIÓN - CONTINUIDAD 2022

Nro.	Detalle	Monto Invertido 2022	PIA 2023
35	PROYECTOS INVERSION	87'327,439.30	157'380,274.00

PROYECTOS EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2022

Nro.	Detalle	Monto Invertido 2022	PIA 2023
13	PROYECTOS INVERSION	2'716,633.56	7'294,231.00





DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

SITUACIÓN ENCONTRADA	ACCIONES IMPLEMENTADAS PRIMEROS DÍAS	ACCIONES PROGRAMADAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DURANTE EL 2023
<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos desfinanciados / con asignación presupuestal mínima. • Se ha encontrado proyectos con adicionales aprobados, superando los techos presupuestales • Se ha encontrado documentos en trámite de ampliación de plazo y presupuestales sin aprobar. • Se ha encontrado ejecución de partidas en obra sin la debida autorización. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha solicitado una mayor asignación de recursos al MEF • Se ha dispuesto la culminación de proyectos emblemáticos y así proceder con su liquidación • Se ha contratado coordinadores de obra y supervisores para agilizar, además de implementar la nueva Directiva. • Se ha responsabilizado a los residentes en el cumplimiento de la directiva. 	<ul style="list-style-type: none"> • Priorizar los proyectos en la PMI para su culminación. • Se realizará el deslinde de responsabilidades en la liquidaciones practicadas por la entidad. • Seguir contratando coordinadores capacitados y especialistas para la correcta ejecución de obra. • Se va programar capacitaciones al personal tecnico de obra para la adecuada implementación de los documentos (siga, ms proyect, bim, etc).



DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

SITUACIÓN ENCONTRADA	ACCIONES IMPLEMENTADAS PRIMEROS DÍAS	ACCIONES PROGRAMADAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DURANTE EL 2023
<ul style="list-style-type: none"> • Se ha encontrado denuncias de SUNAFIL, aplicando penalidad a la Entidad. • Se ha encontrado ejecución de obra sin las debida autorizaciones (ANA, PMA, ETC). • Se ha recepcionado inversión donde se ha revertido el presupuesto RO, quedando desfinanciado. • Se ha encontrado varios procesos declarados desiertos, generando mayores costos a la obra 	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha contratado los servicios de un abogado laboral para llevar los casos. • Se ha contratado residentes para subsanar las diversas autorizaciones para la ejecución de obra • Se ha asignado presupuesto de la entidad para la culminación de los proyectos. • Contratación de un personal especialista en contrataciones para realizar el filtro y llevar correctamente el control. 	<ul style="list-style-type: none"> • Generar una oficina especializada para atender casos de SUNAFIL. • Solicitar que la elaboración de expedientes técnicos sean con las autorizaciones requeridas. • Realizar una adecuada programación de recursos. • Capacitar permanentemente al personal.



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURÍMAC"



DATOS DE LA INVERSIÓN:	CUI : 2215017	ADM. DIRECTA	
MONTO EXP. TÉCNICO:	160'772,368.43		
MONTO ACTUALIZADO:	182'834,410.28		
MONTO ADICIONAL:	22'062,041.80	13.72 %	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	720	DIAS CALENDARIO	
INICIO DE OBRA:	10/05/2022		
AMPLIACIÓN DE PLAZO:	0	DIAS CALENDARIO	
FIN DE OBRA:	28/04/2024		
AVANCE FISICO AL 2022:	23'329,926.54	16.64 %	P 41.07%
AVANCE FINANCIERO AL 2022:	57'428,507.74	31.41 %	P 41.07%

SITUACIÓN ENCONTRADA: -DESDE LA ETAPA DE CONCEPCION DEL PROYECTO EL DISEÑO DE PRESAS ES INVIABLE CONSTRUCTIVAMENTE EN NUESTRO MEDIO. – EJECUCIÓN INICIAL CON SUB METAS SIN APROBACIÓN – COMPRA DE TUBERIAS CON RECEPCIÓN CUESTIONABLE EN CUANTO A CALIDAD. – SE DIO CONFORMIDAD Y PAGO DE SEVICIOS SIN HABERSE CONCLUIDO. – MODIFICACIÓN DE PRESAS PERUANITA Y CHINQUILLAY EN FASE DE EJECUCIÓN.

ACCIONES IMPLEMENTADAS: - REINICIO INMEDIATO DE SUB METAS CON MATERIALES DISPONIBLES EN CANCHA CON PELIGRO DE VENCIMIENTO. –CONTRATACIÓN DE DOS ESPECIALISTAS EN PRESAS PARA EVALUACIÓN DE PRESAS PERUANITA Y CHINQUILLAY. -SE EJECUTAN LOS SISTEMAS DE RIEGO Y CONDUCCIÓN. –SE VIENE REALIZANDO LA MODIFICACIÓN DE LA PRESA PARCCO.



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC"



DATOS DE LA INVERSIÓN:	CUI : 2234703	ADM. DIRECTA	
MONTO EXP. TÉCNICO:	19'902,744.01		
MONTO ACTUALIZADO:	31'643,774.50		
MONTO ADICIONAL:	11'741,030.50	58.99 %	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	420	DIAS CALENDARIO	
INICIO DE OBRA:	17/07/2019		
AMPLIACIÓN DE PLAZO:	1194	DIAS CALENDARIO	
FIN DE OBRA:	08/09/2020	R 12/05/2023	
AVANCE FISICO AL 2022:	20'150,615.44	91.62 %	P 100.0%
AVANCE FINANCIERO AL 2022:	28'631,629.99	94.51 %	P 100.0%

SITUACIÓN ENCONTRADA: - MUCHAS AMPLIACIONES DE PLAZO Y PRESUPUESTALES APROBADAS Y EN PROCESO DE APROBACIÓN. – EJECUCIÓN DE PARTIDAS SIN RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN. -

ACCIONES IMPLEMENTADAS: - REINICIO INMEDIATO CON MATERIALES DISPONIBLES EN CANCHA CON PELIGRO DE VENCIMIENTO. – SE HA DISPUESTO LA CELERIDAD EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y EN VIAS DE REGULARIZACIÓN CON EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES. OBRA PRIORIZADA PARA SU CULMINACIÓN.



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGO CONTRA INUNDACIONES EN 3.240 KM DEL CAUCE DEL RIO CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES DE LA REGION APURIMAC"

DATOS DE LA INVERSIÓN:	CUI : 2233835	ADM. DIRECTA	
MONTO EXP. TÉCNICO:	67,038,047.33		
MONTO ACTUALIZADO:	67'748,798.13		
MONTO ADICIONAL:	0.00	0.00 %	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	540	DIAS CALENDARIO	
INICIO DE OBRA:	20/06/2022		
AMPLIACIÓN DE PLAZO:	0	DIAS CALENDARIO	
FIN DE OBRA:	11/12/2023	R 11/12/2023	
AVANCE FISICO AL 2022:	487,442.39	0.78 %	P 6.23%
AVANCE FINANCIERO AL 2022:	904,703.20	1.34 %	P 6.23%
SITUACIÓN ENCONTRADA: - OBRA PARALIZADA POR FALTA DE PERMISO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA. -PIA ASIGNADO INSUFICIENTE			
ACCIONES IMPLEMENTADAS: - SE HA REALIZADO EL TRÁMITE EN ANA. SE TIENE PROGRAMADO REINICIAR LA OBRA UNA VEZ QUE PASE LA EPOCA DE LLUVIAS Y SE CUENTE CON LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN.			



2023 - 2026

PROYECTOS POR CONTRATA

Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo



Templo Colonial Pampamarca - Aymaraes



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA **MANUEL EUFRACIO ALVAREZ DURAN** - DISTRITO DE COTABAMBAS - PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURIMAC"



DATOS DE LA INVERSIÓN:	CUI : 2194907	CONTRATA	
MONTO EXP. TÉCNICO:	6'986,615.87		
MONTO CONTRATO:	5'919,022.21		
MONTO ADICIONAL:	1'554,369.79	26.26 %	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	270	DIAS CALENDARIO	
INICIO DE OBRA:	16/07/2019		
SUSPENSIÓN DE PLAZO:	1,312	DIAS CALENDARIO	
FIN DE OBRA:	10/04/2020	R 20/03/2024	
AVANCE FISICO AL 2022:	165,751.00	2.80 %	P 100.0%
AVANCE FINANCIERO AL 2022:	3'125,166.28	35.94 %	P 100.0%

SITUACIÓN ENCONTRADA: - ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA CAUSA DE PARALIZACIÓN DE OBRA Y POSTERIOR SUSPENSIÓN. – SE REALIZARON ADELANTOS DIRECTO Y POR MATERIALES – SE REALIZO EL PAGO INDEBIDO DE RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES CONFORME AL ACTA DE CONCILIACIÓN POR ACUERDO TOTAL N° 132-2022-CCA DE FECHA 07/11/2022 POR S/ 779,249.10. – EL CONTRATISTA REMITIÓ CARTAS SOLICITANDO AMPLIACIONES DE PLAZO Y AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN.

ACCIONES IMPLEMENTADAS: - SE SOLICITÓ AL CONTRATISTA REINICIAR LA OBRA EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO TOTAL. – SE DENEGÓ AMPLIACIÓN DE PLAZO. -SE APERCIBIÓ AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO AL ACUERDO TOTAL. – SE CONCILIÓ PARA REINICIAR LA OBRA EL 01 DE ABRIL DEL 2023. –A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCIÓN.



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CATEGORIA I-2 DEL **PUESTO DE SALUD DE HUAYLLATI** DE HUAYLLATI, DISTRITO DE HUAYLLATI - GRAU – APURIMAC"



DATOS DE LA INVERSIÓN:	CUI : 2334493	CONTRATA	
MONTO EXP. TÉCNICO:	6'544,491.88		
MONTO CONTRATO:	4'331,170.01		
MONTO ADICIONAL:	46,389.89	1.07 %	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	180	DIAS CALENDARIO	
INICIO DE OBRA:	11/05/2022		
AMPLIACIÓN DE PLAZO:	0	DIAS CALENDARIO	
FIN DE OBRA:	06/11/2022	R 31/03/2023	
AVANCE FISICO AL 2022:	2'445,378.59	56.46 %	P 100.0%
AVANCE FINANCIERO AL 2022:	3'230,458.07	74.59 %	P 100.0%

SITUACIÓN ENCONTRADA: - OBRA ATRASADA E INCONCLUSA. – PLAZO VENCIDO. – EL CONTRATISTA SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO.

ACCIONES IMPLEMENTADAS: - SE PROCEDIÓ A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES TÉCNICO LEGALES PARA RESOLVER EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO. –EL CONTRATISTA ACELERA LOS TRABAJOS Y DEMUESTRA LA BUENA FÉ DE CULMINAR LA OBRA. – LA ENTIDAD ACEPTA POR CONVENIENCIA DICHO PEDIDO. – SE IMPLEMENTA LAS ACCIONES PARA APLICAR LA MÁXIMA PENALIDAD AL CONTRATISTA. – SE APLICA LA MÁXIMA PENALIDAD.

OBRA CONCLUIDA



PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC"



DATOS DE LA INVERSIÓN:	CUI : 2078213	CONTRATA	
MONTO ACTUALIZADO	160'142,696.06		
MONTO CONTRATO:	122'456,498.80		
MONTO ADICIONAL:	12'501,753.45	10.21 %	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2194	DIAS CALENDARIO	
INICIO DE OBRA:	11/02/2013		
AMPLIACIÓN DE PLAZO:	1594	DIAS CALENDARIO	
FIN DE OBRA:	13/02/2019	R 00/00/2024	
AVANCE FISICO AL 2022:	56'817,436.83	42.10 %	P 100.0%
AVANCE FINANCIERO AL 2022:	110'424,582.71	90.17 %	P 100.0%

SITUACIÓN ENCONTRADA: - OBRA ATRASADA E INCONCLUSA. – PLAZO VENCIDO. – OBRA A EJECUTARSE MEDIANTE CONVENIO N° 014-2020 CON EL MINSA VIGENTE A LA FECHA, PENDIENTE A CUMPLIRSE. – SE REALIZÓ EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA CUYO PRODUCTO NO SE HA PODIDO UBICAR EN FÍSICO. – LOS ARBITRAJES ANTERIORES FUERON DECLARADOS NULOS. – EL CONTRATISTA APERCIBE A LA ENTIDAD. –EL CONTRATISTA RESUELVE A LA ENTIDAD.

ACCIONES IMPLEMENTADAS: - SE PROCEDIÓ A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES TÉCNICO LEGALES Y SE RESOLVIÓ EL CONTRATO POR DAÑOS IRREVERSIBLES Y LA PERDIDA DE VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO. –EL CONTRATISTA RESOLVIÓ CONTRATO, A LO CUAL LA ENTIDAD OBSERVÓ LLEVANDOLO AL ARBITRAJE. –LA ENTIDAD INICIA DESTRABE DEL PROYECTO PLANTEANDO UNA COEJECUCIÓN CON EL MINSA.

GERENTE REGIONAL DE
RECURSOS NATURALES Y GMA



GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA DEL RÍO PAMPAS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC"



DATOS DE LA INVERSIÓN:	CUI : 2250114	ADM. DIRECTA	
MONTO EXP. TÉCNICO:	8,546,499.00		
MONTO ACTUALIZADO:	9,008,695.20		
MONTO ADICIONAL:	462,196.20	5.25%	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1443	DIAS CALENDARIO	
INICIO DE OBRA:	05/09/2019		
AMPLIACIÓN DE PLAZO:	0		
FIN DE OBRA:	01/12/2025		
AVANCE FÍSICO AL 2022:	2,851,691.71	50.25 %	P.E 49.75%
AVANCE FINANCIERO AL 2022:	4,983,008.00	55.31 %	P.E 50.00%
PIM - 2023	2,217,940.00		

Situación encontrada: El proyecto presenta deficiencias en el Expediente Técnico, a nivel de partidas, especificaciones técnicas y costos unitarios.
-se encontró pendiente la ejecución del inventario de 205 fuentes de aguas superficiales clasificados en tres unidades Hidrográficas.

Acciones Implementadas: Se viene efectuando la modificación del Expediente Técnico en cumplimiento a la Directiva 001-2022-GR-APURIMAC/GR.
-se dio inicio la producción de 500 mil plantones forestales con especies nativas, para la forestación y reforestación.
-mas de 100 hectáreas protegidas en cabecera de cuencas en las provincias de Andahuaylas y Chincheros.
-conformación de mesas técnicas y fortalecimiento de capacidades organizacionales a usuarios de agua agrarios y no agrarios.



GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTOANDINAS EN LA UNIDAD HIDROGRÁFICA DE RIO ANTABAMBA - REGIÓN APURÍMAC"



DATOS DE LA INVERSIÓN:	CUI : 2250276	ADM. DIRECTA	
MONTO EXP. TÉCNICO:	8,419,249.00		
MONTO ACTUALIZADO:	10,246,999.08		
MONTO ADICIONAL:	1,827,750.08	6.81%	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1095	DIAS CALENDARIO	
INICIO DE OBRA:	12/06/2017		
AMPLIACIÓN DE PLAZO:	412	DIAS CALENDARIO	
FIN DE OBRA:	30/06/2023		
AVANCE FÍSICO AL 2022:	5,758,911.00	73.21%	P.E 26.79%
AVANCE FINANCIERO AL 2022:	7,941,839.96	77.50%	P.E 22.50%
PIM - 2023	2,268,899.00		

Situación encontrada: El proyecto se recepcionó con el 40% de mortandad de especies nativas forestales de un total de 644 hectáreas, instalados en campo definitivo.
-se identificó un saldo de 480 hectáreas, por instalar en la zona de intervención del proyecto.
-El proyecto presentada deficiencias en el Expediente Técnico, a nivel de partidas, especificaciones técnicas y costos unitarios.

Acciones implementadas: Se prevé las acciones de contingencia (uso de hidrogel en la plantación) y riegos a fin de reducir la mortandad de plantones en campo definitivo.
-Se continuara con la producción de 500 mil plantones forestales con especies nativas.
-Se realizó la instalación de 215 mil plantones forestales en 384 hectáreas, en las zonas de intervención del proyecto.
-se dinamiza la economía local con la generación de 350 puestos de trabajos temporales en el ámbito de intervención del proyecto.



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"



DATOS DE LA INVERSIÓN:	CUI : 2457746	ADM. DIRECTA	
MONTO EXP. TÉCNICO:	1,645,565.01		
MONTO ACTUALIZADO:	3,583,745.32		
MONTO ADICIONAL:	1,938,180.31	54.08%	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	730	DIAS CALENDARIO	
INICIO DE OBRA:	01/10/2019		
AMPLIACIÓN DE PLAZO:	0	DIAS CALENDARIO	
FIN DE OBRA:	01/12/2025		
AVANCE FISICO AL 2022:	1,124,768.89	50.49%	P.E 49.51%
AVANCE FINANCIERO AL 2022:	1,830,221.60	51.08%	P.E 48.92%
PIM- 2023	1,100,672.00		

Situación encontrada: *Se recepciono, estudios temáticos del proceso de la Zonificación Ecológica y Económica - ZEE del departamento de Apurímac en un estado situacional de 09 aprobados, 06 observados y 02 pendientes de elaboración.*

Acciones de implementación: Firma de convenio Interinstitucional entre el GORE Apurímac y la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarias – MIDAGRI.

-Se ha concluido con el levantamiento de observaciones del estudio de Biodiversidad y hábitats, el cual se ha enviado al Ministerio Ambiente, para su opinión técnica favorable.

GERENTE REGIONAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

SITUACIÓN ENCONTRADA	ACCIONES IMPLEMENTADAS PRIMEROS DÍAS	ACCIONES PROGRAMADAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DURANTE EL 2023
<ul style="list-style-type: none"> Proyecto Regional Palta comprendido en la cartera de inversiones de la SGAPyS. Adquisición de vehículos: camionetas, motos y jabsas. Con PIA 2023 de S/. 265,500.00 mil soles 	<ul style="list-style-type: none"> Se concluyó el proceso de adquisición de camioneta, motos y jabsas. Inicio de trámite placas, SOAT y Seguros. 	<ul style="list-style-type: none"> Habilitación presupuestal de dos millones. Entrega y traslado de 720 mil plantones de palta en todo el ámbito de intervención. Entrega de camionetas, motos y jabsas. Exportación de mas de 25 toneladas de palta.
<ul style="list-style-type: none"> Proyecto Regional Miel, está comprendido en la cartera de inversiones de la SGAPyS. Sin aprobación resolutive de Expediente Técnico. con PIA de S/. 1,377,850.00 soles. 	<ul style="list-style-type: none"> Se dio inicio con el trámite de aprobación resolutive del expediente técnico del proyecto Miel. 	<ul style="list-style-type: none"> Aprobación resolutive del expediente técnico del proyecto Miel. Inicio de compatibilidad de Exp. Tec. Se dio inicio de ejecución del proyecto regional Miel
<ul style="list-style-type: none"> Proyecto Regional Cuy, está comprendido en la cartera de inversiones de la SGAPyS. Proyecto de continuidad con PIA S/ 1,400,519.00 	<ul style="list-style-type: none"> Inicio de continuidad del proyecto regional Cuy, en todo el ámbito de intervención. 	<ul style="list-style-type: none"> Se dio inicio de ejecución del proyecto regional Cuy. Adquisición de materiales para su continuidad
<ul style="list-style-type: none"> Procompite – 2019, se encontró inconclusa la ejecución y liquidación de planes de negocio. En proceso de adquisición de 03 tractores agrícolas programados para el 2023. implementación del programa PROCOMPITE 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> Reinicio y ejecución de 10 planes de negocio por S/. 1,200,000.00. Reprogramación del proceso de adquisición de 03 tractores agrícolas. Aprobación de recursos para PROCOMPITE 2023 por S/. 6,000,000.00 	<ul style="list-style-type: none"> Culminación de 10 planes de negocio pendientes de ejecución; liquidación de 40 planes de negocio a diciembre 2023. proceso de adquisición y entrega 03 tractores. Implementación y ejecución del PROCOMPITE 2023.
<ul style="list-style-type: none"> Proyecto de Inversión "Ruta Arguedas" comprendido en la cartera de inversiones de la SGMyc, con PIA de S/. 650,629.00. 	<ul style="list-style-type: none"> Reinicio de elaboración y actualización de Expediente Técnico para su programación y culminación. 	<ul style="list-style-type: none"> Culminación y aprobación del expediente en el presente año 2023.
<ul style="list-style-type: none"> Proyecto Cañón del Apurímac está comprendido en la cartera de inversiones de la SGMyc, considerada su ejecución en 3 etapas, con PIA de S/. 1,377,850.00 soles. 	<ul style="list-style-type: none"> Se viene retomando las acciones para continuar con los trámites de gestión de arreglos institucionales para el inicio de ejecución (trámites ante SUNARP, ANA, MINCETUR). 	<ul style="list-style-type: none"> Se prevé que los expedientes técnicos aprobados de la Etapa II y III sean concluidos para el mes de abril 2023, con los documentos de sostenibilidad y arreglos institucionales saneados.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

SITUACIÓN ENCONTRADA	ACCIONES IMPLEMENTADAS PRIMEROS DÍAS	ACCIONES PROGRAMADAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DURANTE EL 2023
<ul style="list-style-type: none"> Escasa información respecto al presupuesto asignado 2019, 2020 (Estado de emergencia) 	<ul style="list-style-type: none"> Se solicito mayor asignación presupuestal, para cumplir con las AE en el 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> A la espera de una respuesta por parte de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y acondicionamiento territorial.
<ul style="list-style-type: none"> Local institucional con deficiencias 	<ul style="list-style-type: none"> Propuesta de inversión para construcción de nuevo local institucional. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinaciones con la Oficina Regional de Formulación y Evaluación de Inversiones.
<ul style="list-style-type: none"> El local en Villa Ampay no cuenta con servicios básicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Reunión de coordinación para 	<ul style="list-style-type: none"> Implementar los servicios básicos.

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

SITUACIÓN ENCONTRADA	ACCIONES IMPLEMENTADAS PRIMEROS DÍAS	ACCIONES PROGRAMADAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DURANTE EL 2023
<ul style="list-style-type: none"> Centro de producción de alevinos de trucha Atumpata paralizado, Sin producción, sin personal. 	<ul style="list-style-type: none"> Puesta en operación del centro de producción de alevinos de alevinos de Truchas 	<ul style="list-style-type: none"> Actividad de operación y mantenimiento del centro de producción de alevinos de Truchas
<ul style="list-style-type: none"> Sin implementación un programa de promoción al consumo de pescado 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinación con el Programa de "A comer pescado" 	<ul style="list-style-type: none"> Cobertura el 50% de distritos de la región.
<ul style="list-style-type: none"> Sin personal técnico para asistencia técnica, capacitación y fiscalización 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar un plan de asistencia técnica, capacitación y fiscalización 	<ul style="list-style-type: none"> Actividad de operación y mantenimiento del centro de producción de alevinos de Truchas
<ul style="list-style-type: none"> Plan regional de acuicultura sin actualizar 	<ul style="list-style-type: none"> Instalación de la mesa técnica en acuicultura 	<ul style="list-style-type: none"> Se tiene previsto dar inicio de la mesa técnica para mayo 2023

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

SITUACIÓN ENCONTRADA	ACCIONES IMPLEMENTADAS PRIMEROS DÍAS	ACCIONES PROGRAMADAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DURANTE EL 2023
<ul style="list-style-type: none"> Escasos niveles de formalización (1 por año) y falta de asistencias técnica. 	<ul style="list-style-type: none"> Puesta en marcha del PLAN INTEGRAL DE FORMALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE y atención descentralizada. 	<ul style="list-style-type: none"> PLAN INTEGRAL DE FORMALIZACIÓN 2023.
<ul style="list-style-type: none"> No existe articulación en materia de energía y fiscalizaciones deficientes. 	<ul style="list-style-type: none"> Implementación del PLAN AMPLIACIÓN DE FRONTERA ELECTRICA para incorporación de inversiones al MINEM. 	<ul style="list-style-type: none"> Ampliar la cobertura eléctrica en 20 distritos en una primera etapa.



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SUBGERENCIA DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA EN 85 LOCALIDADES DE 30 DISTRITOS EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS, AYMARAES Y CHINCHEROS



Detalles del proyecto:	
Monto según ET:	18,645,594.00
Monto actualizado:	22,419,258.11
% Ejecución física	68.1%
% Ejecución financiera	69.5%
Fecha de inicio de obra	16/07/2020
Fecha de término programado	16/07/2023
PIM 2023	2,265,500.00

Situación actual:

- Proyecto de continuidad con presupuesto insuficiente para su ejecución en el presente año 2023.
- Se logró la asignación de 2 millones para su ejecución en el presente año 2023.
- Se realizó la entrega de mas de 1 millón de plántones en toda la región Apurímac.
- Se culminó con la construcción de 05 Centros de transferencia tecnológica.



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SUBGERENCIA DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN CINCO PROVINCIAS DE LA REGION APURIMAC



Monto de la inversión:	
Monto según ET:	4,211,160.00
Monto actualizado:	6,007,662.72
% Ejecución física	31.1%
% Ejecución financiera	31.6%
Fecha de inicio de obra	15/11/2021
Fecha de término programado	15/11/2024
PIM 2023	1,400,519.00

Situación actual:

- Se logró la implementación del Centro de Trasferencia de Tecnología Productiva en la Granja San Antonio.
- Logrando la disponibilidad de reproductores mejorados para los beneficiarios en toda la región de Apurímac.
- Capacitación y asistencia técnica personalizada en el mejoramiento de la infraestructura productiva, alimentación, sanidad y mejoramiento genético mediante la selección de reproductores.



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CAÑÓN DE APURIMAC EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC



Detalles del proyecto:	
Monto según ET:	45,131,166.03
Monto actualizado:	7,952,239.11 (I Etapa)
% Ejecución física	0 %
% Ejecución financiera	4.7%
Fecha de inicio de obra	01/04/2023
Fecha de término programado	01/04/2026
PIM 2023	1,377,850.00

Situación actual:

- Se dio inicio a la ejecución de la I etapa del proyecto.
- Se tiene previsto disponer los expedientes técnicos aprobados de las Etapas II y III en el mes de abril 2023 con los documentos de sostenibilidad y arreglos institucionales saneados.



Detalles del proyecto:	
PROCOMPITE 2023 MONTO	6,000,000.00
FECHA DE INICIO	01/04/2023
PIM 2023	2,000,000.00

Situación actual PROCOMPITE

- **Procompite 2019-I:** se dio inicio al cierre y transferencia definitiva de bienes en el presente año 2023.
- **Procompite 2019-II:** Se ha logrado la gestión de asignación presupuestal para el reinicio de ejecución de 10 planes de negocio en el presente año 2023.
- **PROCOMPITE 2023:** Se ha dado inicio con la implementación del **PROCOMPITE 2023**, por el monto de 6,000,000.00 soles.
- Adquisición y entrega de 03 tractores a las asociaciones.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL

RECONOCIMIENTO Y TITULACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS



ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
RECONOCIMIENTO DE COMUNIDADES CAMPESINAS BOSQUE DE PIEDRAS LLAMCAMA	TITULOS	1	00	EN PROCESO DE ADJUDICACION
RECONOCIMIENTO DE COMUNIDADES CAMPESINAS CHILLIHUA	TITULOS	1	00	EN PROCESO DE ADJUDICACION
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
TITULACIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JOSE DE KARQUEQUE	TITULOS	1	00	EN PROCESO DE ADJUDICACION

TITULACION Y RECTIFICACIONES DE AREA DE PREDIOS RURALES



ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
TITULACIÓN DE LA UNIDAD TERRITORIAL UCHUPATA – CURAHUASI - ABANCAY	TÍTULOS	227	00	EN PROCESO DE CALIFICACION
DETERMINACIÓN DE LA UNIDAD TERRITORIAL TAPAYRIHUA	TITULOS	400	00	DETERMINACION DE LA UNIDAD TERRITORIAL
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
RECTIFICACIÓN DE ÁREA Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL UCHUPATA – CURAHUASI	CERTIFICADOS	138	00	EN PROCESO DE CALIFICACION
RECTIFICACIÓN DE ÁREA CON INDEPENDIZACIÓN – UCHUPATA - CURAHUASI	CERTIFICADOS	34	00	EN PROCESO DE CALIFICACION
RECTIFICACIÓN DE AREA - TAPAYRIHUA	CERTIFICADOS	200	00	DETERMINACION DE LA UNIDAD TERRITORIAL

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Acción estratégica	Estado situacional	Actividades
1. Producción de alevinos de trucha	<ul style="list-style-type: none"> Adquisición de 100,000 ovas embrionadas de trucha. 	<ul style="list-style-type: none"> Operación y mantenimiento del Centro de Producción de alevinos de truchas en ATUMPATA.
2. Promoción del consumo de productos hidrobiológicos	<ul style="list-style-type: none"> Coordinación con el programa "A COMER PESCADO" 	<ul style="list-style-type: none"> Cobertura mas del 50% de distritos de la Región Apurímac con el programa "A COMER PESCADO"
3. Cooperación Institucional	<ul style="list-style-type: none"> Convenio con el SANIPES Apoyo crediticio del FONDEPES Convenio con las municipalidades 	<ul style="list-style-type: none"> Habilitación sanitaria del Atumpata S/ 500 mil en créditos promocionales del FONDEPES 7 convenios con municipalidades
4. Instalación de la Mesa Técnica en Pesca y Acuicultura	<ul style="list-style-type: none"> Reconocimiento con resolución directoral 	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo en el desarrollo de los planes, programas y proyectos en pesca y acuicultura; así como otros fondos concursables.





ACCIONES ESTRATÉGICAS

Acción estratégica	Estado situacional	Actividades
1. IDENTIFICACIÓN DE PROSPECTOS FORMALIZABLES (Plan de trabajo de formalización integral)	Proceso de formalización deficiente. (01 REINFO formalizado por año de un universo de 7700).	Implementación del PLAN INTEGRAL DE FORMALIZACIÓN.
2. MESAS TÉCNICAS PERMANENTES	No se encontró un plan integral para intervención en zonas de especial atención.	Implementación de mesas técnicas permanentes.
3. PLAN DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA	No se encontró articulación entre gobiernos subnacionales al programa nacional de electrificación rural.	Proceso de incorporar a los gobiernos subnacionales en la cartera de inversiones del MINEM.
4. PLAN INTEGRAL DE CAPACITACIÓN		
5. ALIADOS ESTRATÉGICOS	No se articuló con instituciones vinculantes como MEGAN (proyecto canadiense), CIP, UNAMBA, MUNICIPALIDAD DISTRITAL, DGFM.	Articulación permanente con entidades adscritas.



PRODESARROLLO



PROCESOS LEGALES

Expedientes Legales encontrados

Expedientes	Cantidad	Monto S/
Obligaciones de pago AFP	23	65,145.91
Expedientes Contencioso administrativo	2	414,239.43
Procesos Administrativos Sancionadores - SUNAFIL	4	59,928.00
Expedientes Archivados	17	-

Total: S/ 539,313.34

Periodo 2014 – 2022

Acciones primeros 100 días 2023:

- ✓ la emisión de Proyectar y redactar respuestas a las imputaciones de cargo e informes finales de instrucción emitidas por parte de la autoridad fiscalizadora en materia laboral (SUNAFIL).
- ✓ se ha afrontado judicialmente demandas de las AFP, en materia de Obligación de dar suma de dinero, sobre presuntos incumplimientos de pago de aportes previsionales por parte de la **Unidad Ejecutora 004 Pro Desarrollo Apurímac** interponiéndose las siguientes acciones y actos procesales dentro de los plazos legales establecidos:
 1. Absolución de demandas.
 2. Deducción de Nulidades.
 3. Comparecencia a las audiencias programadas.
 4. Interposición de Recursos impugnatorios.
 5. Contradicción de Mandatos ejecutivos.



DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

	Nombre del P.I	Monto	Ejecución física	Ejecución financiera	PIM 2023	Situación encontrada	Acciones
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE MARJUNI, SANTA ISABEL DE CAYPE Y CRUZPATA DEL DISTRITO DE LAMBRAMA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	21,276,786.12	80.16%	67.35 %	236,802.00	Con elaboración del Expediente Técnico paralizado y una ejecución presupuestal a diciembre del 2022 de S/ 494,853.72.	Se realizó el informe de corte y la continuidad de la elaboración del Expediente Técnico en el presente año fiscal con un avance al mes de marzo de 90.34%, hasta la aprobación mediante acto resolutivo.
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE YANACA, TUMIRE Y SARAICA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAEES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	29,643,060.84	54.9%	79.18%	236,305.00	En elaboración del Expediente Técnico paralizado y una ejecución presupuestal a diciembre del 2022 de S/ 470,006.23.	Se realizó el informe de corte y la continuidad de la elaboración del Expediente Técnico en el presente año fiscal con un avance al mes de marzo de 65.98%, hasta la aprobación mediante acto resolutivo.



DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

	Nombre de la Actividad	Monto	Meta Física	Observaciones
3	MANTENIMIENTO DEL CANAL MARIÑO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY	S/ 541,358.24	✓ El Canal Mariño se identificó los puntos críticos y afectados de 26 km en beneficio de la comisión de usuarios del canal de riego del Mariño..	Aprobado con Resolución Directoral N° 047-2023-G.R.APURIMAC/UE.PDA/DE



SE OBSERVA EL DETERIORO DEL PISO Y PAREDES LATERALES DEL CANAL EN EL SECTOR DE CCONCHOPATA.



SE OBSERVA EL DETERIORO DEL CANAL EN EL SECTOR DE CALABAZA PATA DONDE SE PRODUCE INFILTRACION POR ENCHARCAMIENTO.



SE OBSERVA FISURAS EN LAS PAREDES LATERALES Y PISO DEL CANAL.

mar. 2023 11:35:31 a.m.
18L 731450 8492002
#Canal mariño



COORDINACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

SITUACIÓN ENCONTRADA	ACCIONES IMPLEMENTADAS PRIMEROS DÍAS	ACCIONES PROGRAMADAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DURANTE EL 2023
Proyectos de inversión paralizados con presupuesto insuficiente de continuidad y culminación en el presente año fiscal 2023 y con problemas de carácter administrativo y técnico entre otros.	Se procedió a su evaluación del estado situacional de cada proyecto para plantear alternativas de solución, consolidándose el estado actual y/o situacional de los proyectos de inversión que se vinieron ejecutando, paralizados y culminados hasta diciembre del año fiscal 2022 e informe de corte.	Conformación de comités de recepción y cierre de inversiones, liquidaciones.
	Elaboración y remisión de los planes de trabajo de los proyectos de inversión asignados al PIA 2023.	Culminación de inversiones, con mayor avance físico.
	Coordinación con las direcciones y demás oficinas de línea, sobre los documentos de gestión, acervo documentario para la mejora de toma de decisiones y trámites administrativos.	Identificación y propuesta de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático de tipo 003 (créditos y anulaciones dentro de la unidad ejecutora) a favor del proyecto con CUI N° 2240678, 2187605, 2312602 y 2188982, cuyas inversiones están orientadas al cierre de brechas, son de continuidad y cuya ejecución culmina en el presente año fiscal. Así mismo, dar inicio con la liquidación técnica y financiera y posterior cierre de inversión - Formato N° 09.
Proyectos de inversión sin presupuesto para el presente año fiscal 2023.	Evaluación de los expedientes técnicos aprobados.	
	Evaluación del PIA 2023 para el reinicio de las obras que se ejecutan por la modalidad de administración Directa y autorización para el reinicio.	



COORDINACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

SITUACIÓN ENCONTRADA	ACCIONES IMPLEMENTADAS PRIMEROS DÍAS
Proyectos de inversión con plazos vencidos	Se ha procedido a verificar que los plazos de ejecución de obra aprobados en su plan de trabajo (fecha de inicio y fecha de culminación), se encuentran fuera de plazo en un 80% de los proyectos por incumplimientos de los profesionales responsables – residentes de obras, inspectores de obra, inconvenientes como problemas inicio de obra sin contar con material en almacén de obra, la no programación real del cronograma (calendario) de obra, ruta crítica, entre otros.
Proyectos e inversión sin actualización en los aplicativos de seguimiento, sin sinceramiento, sin presupuesto, con plazos vencidos.	Registro, actualización de los proyectos de inversión en el aplicativo de INFOBRAS y Formato N° 08 y Formato N° 12-B del Banco de Inversiones.
	Sinceramiento del avance físico y financiero (por componente) y estado situacional del proyecto GESTION INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.
	Solicitud de demanda adicional de los proyectos de inversión sin asignación presupuestal para la continuidad y culminación de los proyectos asignados a esta Unidad Ejecutora.
	Elaboración y trámite de las ampliaciones de plazo de los proyectos de inversión con plazo vencido de continuidad, debidamente aprobados mediante acto resolutivo.
	Elaboración y trámite de las ampliaciones presupuestales, debidamente aprobados mediante acto resolutivo.



UNIDAD EJECUTORA PRO DESARROLLO

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TOTORAY, CHALLHUAHUACHO, ALAMEDA, CCECCERAY, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC, CUI N° 2269084.



Monto de la inversión:		
Monto según ET:	8,501,485.91	
Monto actualizado:	14,342,520.58	
Monto de adicionales	5,841,034.67	68.71% de incremento
% Ejecución física	PROGRAMADO	EJECUTADO
	93.5%	35.59%
% Ejecución financiera	PROGRAMADO	EJECUTADO
	95%	50.6%
Fecha de inicio de obra	14/02/2022	Atrasado
Fecha de término programado	13/02/2023	
PIM 2023 (segunda asignación)	3,103,325.00	

Situación encontrada:

PARALIZADA y RETRASADA, no se cumplieron con las metas de los trabajos programados y con plazo por vencer (13.02.2023), con desabastecimiento de materiales.

Acciones implementadas:

En el presente periodo se procedió con el trámite y aprobación de ampliación de plazo N° 1, y sinceramiento (corte de obra) a la fecha se encuentra en ejecución con un **avance físico acumulado de 35.59% marzo 2023.**



UNIDAD EJECUTORA PRO DESARROLLO

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CANAL I TINTAY Y CANAL I CAVIRA DE LAS LOCALIDADES DE TINTAY Y CAVIRA, DISTRITO DE KISHUARA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC, CUI N° 2321075.



Monto de la inversión:		
Monto según ET:	9,017,766.32	
Monto actualizado:	11,563,912.91	
Monto de adicionales	0.00	0% de incremento
% Ejecución física	PROGRAMADO	EJECUTADO
	100%	22.22%
% Ejecución financiera	PROGRAMADO	EJECUTADO
	100%	34.2%
Fecha de inicio de obra	01/03/2022	Atrasado
Fecha de término programado	25/12/2023	
PIM 2023 (segunda asignación)	2,860,204.00	

Situación encontrada:

PARALIZADA y RETRASADA, no se cumplieron con las metas de los trabajos programados y con plazo vencido (25.12.2022).

Acciones implementadas:

En el presente periodo se procedió con el trámite y aprobación de ampliación de plazo N° 1, y sinceramiento (corte de obra) a la fecha se encuentra en ejecución con un **avance físico acumulado de 20.99% marzo 2023**.



UNIDAD EJECUTORA PRO DESARROLLO

Proyecto: GESTION INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, CUI N° 2031741.



Monto de la inversión:		
Monto según ET:	51,061,649.40	
Monto actualizado:	79,113,739.24	
Monto de adicionales	28,052,089.84	54.94% de incremento
% Ejecución física	PROGRAMADO	EJECUTADO
	100%	88.81%
% Ejecución financiera	PROGRAMADO	EJECUTADO
	100%	99.9%
Fecha de inicio de obra	15/08/2013	Atrasado
Fecha de término programado	05/04/2023	
PIM 2023 (segunda asignación)	606,001.00	

Situación encontrada:

PARALIZADA y RETRASADA, no se cumplieron con los compromisos de sinceramiento de gasto y culminación del proyecto integral con las metas de los trabajos programados. El proyecto el mención para el presente año fiscal programaron en el PMI con PIA de S/ 6,001.00 soles, presupuesto insuficiente.

Acciones implementadas:

En el presente periodo se dispuso el sinceramiento físico y financiero, a la fecha se cuenta con el sinceramiento (corte de obra) y financiero por componentes, en proceso del informe de modificación en fase de ejecución, aprobación resolutive y registro BI.



UNIDAD EJECUTORA PRO DESARROLLO

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA, PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUIRAHUACHO, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC, CUI N° 2188982



Monto de la inversión:		
Monto según ET:	8,868,115.22	
Monto actualizado:	12,291,472.27	
Monto de adicionales	3,423,357.05	38.60% de incremento
% Ejecución física	PROGRAMADO	EJECUTADO
	100%	93.40%
% Ejecución financiera	PROGRAMADO	EJECUTADO
	100%	99.5%
Fecha de inicio de obra	15/02/2019	Atrasado
Fecha de término programado	25/12/2023	
PIM 2023 (segunda asignación)	0.00	

Situación encontrada:

PARALIZADA, no se cumplieron con las metas de los trabajos programados.

Acciones implementadas:

Se realizó las coordinaciones y pasantía con los beneficiarios del proyecto; el mismo, que se llegó a un acuerdo de la firma del acta de terminación de obra para proceder con la conformación del comité de recepción, posterior liquidación técnica y financiera y cierre de inversión - Formato N° 09; a la fecha cuenta con **ACTA de ENTREGA DE OBRA e INAUGURADA**.



100 DÍAS DE GESTIÓN

*Unidos por el pueblo
¡Muchas gracias!*





Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

